

礙航作業申請書

本公司委託奧立恩德股份有限公司及穩晉港灣工程股份有限公司，擬於民國114年10月20日至114年10月25日(擇3日，1預備日)於104碼頭實施卸料臂安裝工程。

茲向 貴分公司申請港區礙航作業，並檢附相關文件：

1. 施工計畫書

懇請 惠予同意

公司名稱：台灣中油股份有限公司


煉製事業課大林煉油廠

申請人：大林煉油廠海運組

負責人：謝富百(課長)

連絡電話：0955220401(承辦人：胡家鈞)

地址：高雄市小港區沿海四路50號



中華民國 114 年 10 月 14 日


施 工 計 畫 書

一、施工地點：104碼頭

二、施工期程：民國114年10月20日至114年10月25日(擇3日0800-1800)

三、作業項目：卸料臂安裝作業

三、影響範圍：104碼頭及至碼頭面延伸100公尺(如附圖)。

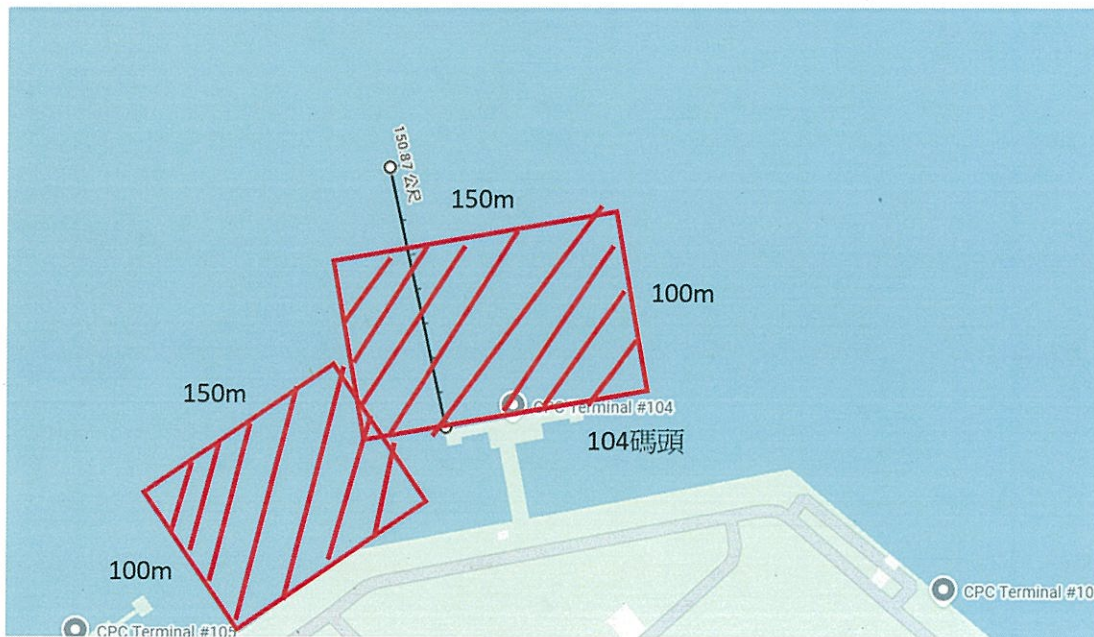

四、作業程序：

1. 穩晉13號靠泊104碼頭旁空地，由穩晉8號將穩晉13號之錨鍊帶往向海面延伸100公尺處兩側下錨。
2. 穩晉13號將卸料臂吊掛至船上，過程中穩晉6號、穩晉8號停靠在穩晉13號旁(此作業無法中途停止)。
3. 由穩晉6號拉穩晉13號將卸料臂載往104碼頭停靠。
4. 穩晉13號靠泊104凸堤碼頭，由穩晉8號將穩晉13號之錨鍊帶往向海面延伸100公尺處兩側下錨。
5. 穩晉13號將卸料臂吊至104碼頭上安裝，過程中穩晉6號、穩晉8號停靠在穩晉13號旁(此作業無法中途停止)。
6. 卸料臂有4個部件，每部件需依步驟1-5作業，需重複共4次，每日作業2部件，共作業2日，1日工程延誤時備用。

伍、下錨示意圖：

吊掛作業時有2處下錨點，會以浮筒標示位置。



船隻清冊

船名	船別	備註
穩晉 6 號	工作船	
穩晉 8 號	工作船	

穩晉 13 號	吊船	
共計 3 艘		
